



УКРЕНЕРГО

Державне підприємство | національна енергетична компанія

вул. С. Петлюри, 25, м. Київ, 01032,
тел.: +38 044 238-30-15, факс: +38 044 238-32-64,
e-mail: nec-kanc@ua.energy, web: ua.energy,
код ЄДРПОУ 00100227

27.07.2017 № 01/8469

Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

Копія:
Народному депутату України
Дунаєву С.В.

Про будівництво ПС 500 кВ «Кремінська»

Шановний Андрію Володимировичу!

ДП «НЕК «Укренерго» розглянуло депутатський запит від 12.07.2017 № 135 народного депутата України Дунаєва С.В., та у відповідь на Ваше звернення від 14.07.2017 № 11/10-2640 повідомляємо наступне.

20.04.2017 в результаті проведення аукціону за тендером «Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська – Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська – Ювілейна, Луганська область», а в подальшому протокольним рішенням тендерного комітету ДП «НЕК «Укренерго» ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» визнано переможцем торгів. В дану закупівлю входить розроблення, погодження та затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та обмежень, державної реєстрації права та обтяжень на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська – Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська – Ювілейна, розроблення проектної і робочої документації з отриманням позитивного експертного звіту, будівельні роботи з постачанням обладнання вітчизняного та іноземного виробництва.

10 травня 2017 р. підписано Договір підряду між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» на загальну суму 1 060 656 334,00 грн без ПДВ (1 272 787 600,80 грн. з ПДВ).

Фінансування будівництва ПС 500 кВ «Кремінська» передбачається за рахунок коштів тарифу ДП «НЕК «Укренерго», які закладені в інвестиційну програму 2016 – 2017 рр. Генпідрядник повинен виконати всі необхідні роботи протягом 2017 – 2018 рр.

Техніко-економічне обґрунтування схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 № 446-р.

На даний час проводяться роботи із замовлення та закупівлі основного силового обладнання, а саме:

- погоджені специфікації на КРПЕ 500 кВ, КРПЕ 220 кВ та автотрансформатор;
- погоджуються з постачальниками обладнання технічні вимоги (опитувальні листи) на обладнання ВРП 500 кВ ПС 500 кВ «Кремінська» та ВРП 220 кВ по ПС 220 кВ «Ювілейна».

Щодо стану проектних робіт стадії Проект:

- виконано топо-геодезичну зйомку на ділянці розташування ПС 500 кВ «Кремінська»;
- виконано топо-геодезичну зйомку на ділянці розташування заходів ПЛ 500 кВ;
- виконується топо-геодезична зйомка перетинів ПЛ 220 кВ з існуючими лініями та будується профіль по уточненій трасі ПЛ 220 кВ;

- розроблено остаточний генеральний план підстанції з розміщенням на топо-геодезичній зйомці;

- виконуються проектні роботи по всіх розділах проектної документації.

Орієнтовний термін розроблення проектної документації стадії Проект - вересень-жовтень 2017 р.

Також проведено переговори з експертними організаціями щодо здійснення комплексної експертизи проектної документації. Визначено організацію, яка буде проводити експертизу – «НДІпроектреконструкція».

Щодо виконання робіт з оформлення матеріалів вибору місцезнаходження земельних ділянок, розроблення погодження та затвердження відповідної документації із землеустрою, проведено наступний комплекс робіт:

По Кременському району:

- уточнено місцезнаходження земельної ділянки для розміщення ПС 500 кВ «Кременська»;

- отримано лісовпорядну документацію, проводиться робота з адаптації;

- отримано індексно-кадастрову карту території будівництва по Кременському району;

- отримано матеріали топо-геодезичних вишукувань, які виконувались при розробці проекту Детального плану території по Кременському району;

- проводяться роботи з погодження місцезнаходження об'єкта з користувачем земельної ділянки – ДП «Кременське лісомисливське господарство»;

- заключено договір з ДП «Головний інститут землеустрою» з розроблення погодження та затвердження відповідної документації із землеустрою по Кременському району;

- готується документація для формування клопотання до Кабінету Міністрів України про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

По Попаснянському району

- уточнено місцезнаходження земельної ділянки для розміщення ПЛ 220 кВ по Попаснянському району;

- після проведення громадських слухань та затвердження детального плану території буде оформлено клопотання до Попаснянської РДА на отримання дозволу на розробку землевпорядної документації.

Також направляємо Вам графіки виконання робіт та постачання обладнання по даному об'єкту.

Додаток:

1. Графік поставки обладнання на 1 аркуші, в 1 примірнику.
2. Графік виконання робіт на 1 аркуші, в 1 примірнику.


З повагою,

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора

В.В.Ковальчук




Графік виконання робіт по об'єкту: «Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ "Донбаська-Донська " та ПЛ 220 кВ "Кремінська - Ювілейна", Луганська обл.»

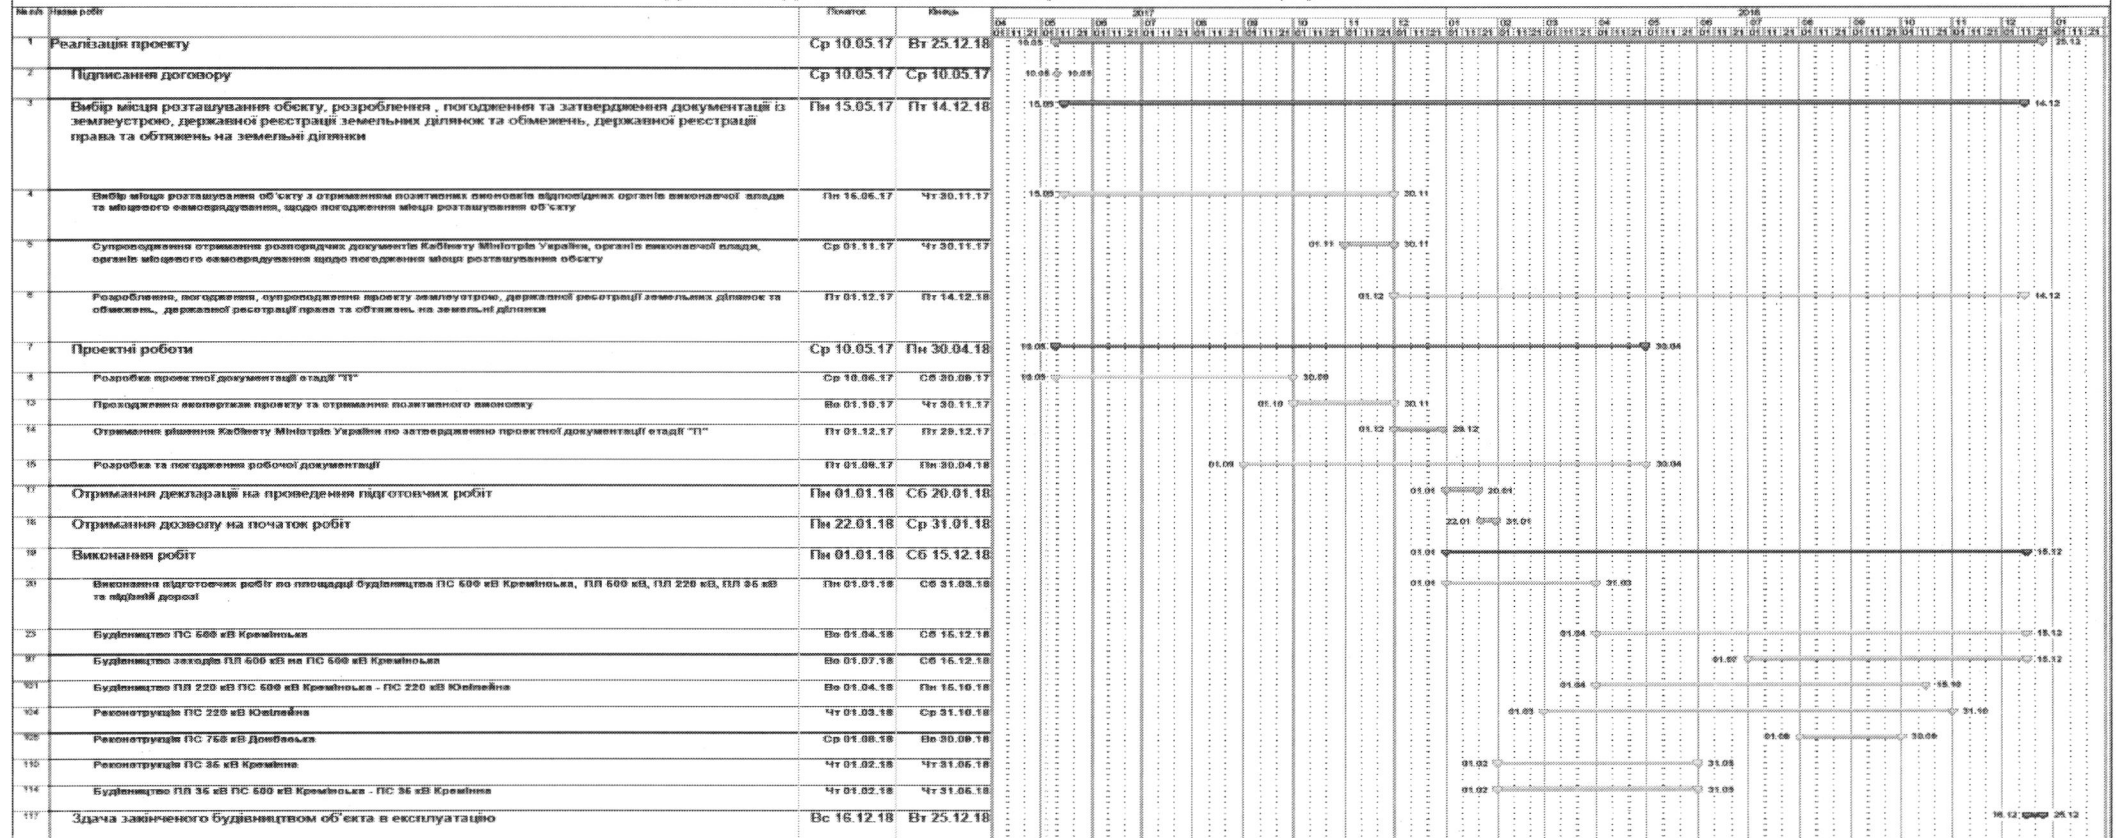

ПРИМІТКА: графік виконується при умові:

-свочасного надання вихідних даних для проектування; перерахування авансових платежів; розгляду, погодження, затвердження місця розташування об'єкту в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Графік поставки обладнання по об'єкту: «Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПП 500 кВ "Донбаська-Донська " та ПП 220 кВ "Кремінська - Ювілейна", Луганська обл.»

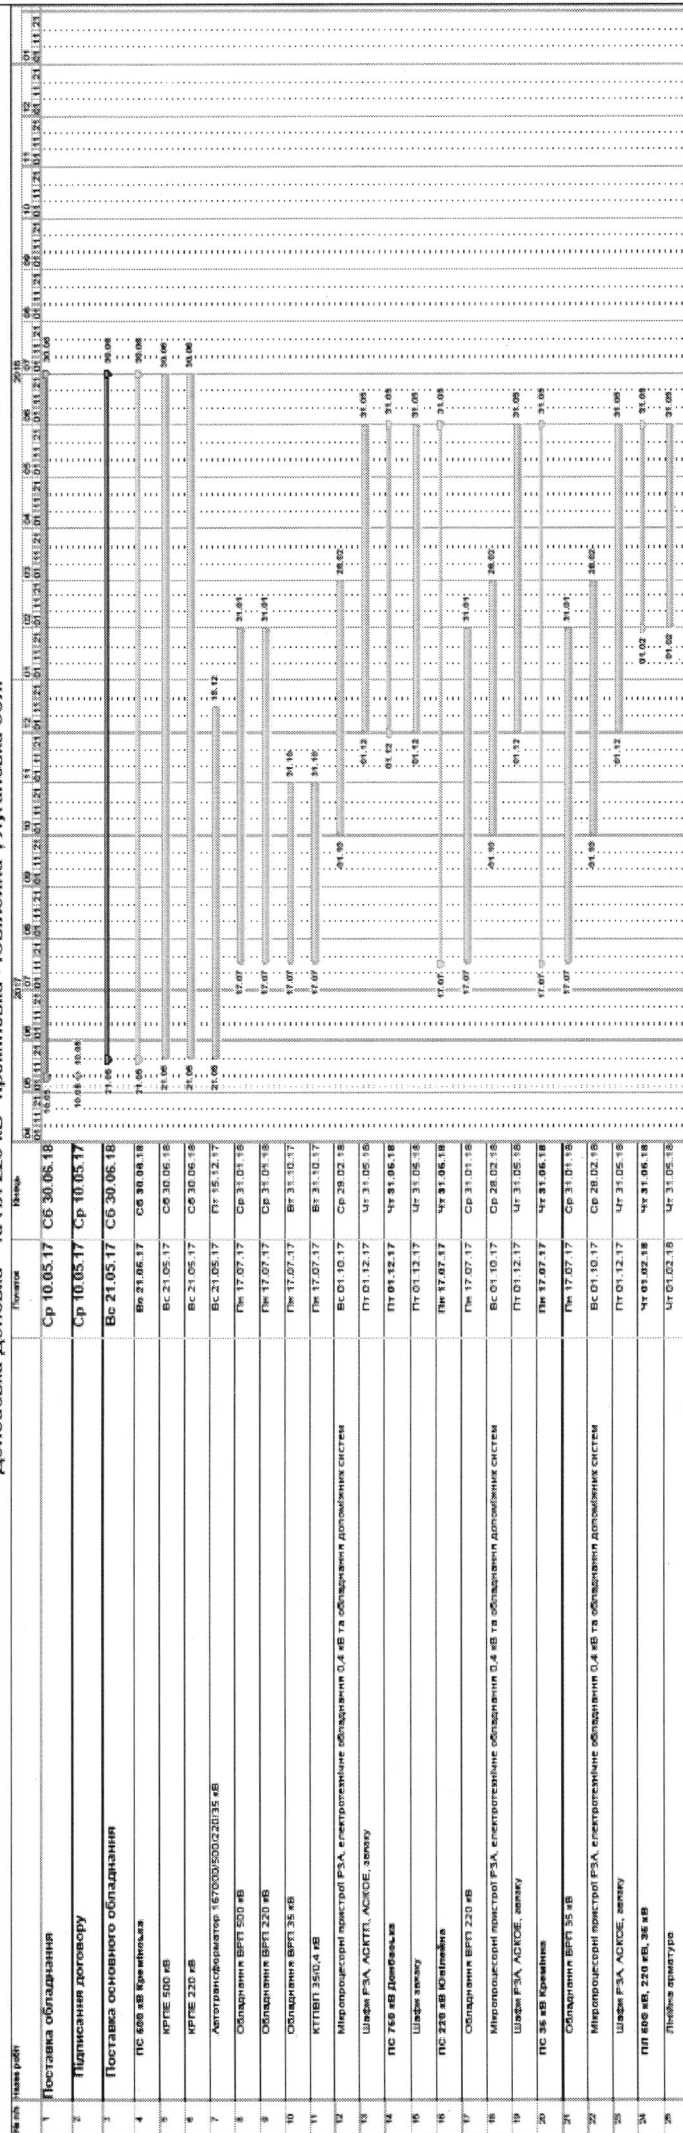

ПРИМІТКА: графік виконується при умові:
- своєчасного надання вихідних даних для проектування;
- своєчасного перерахування авансових платежів.
