



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168 Тел.: (044) 234-71-52 Факс: (044) 226-20-15
E-mail: kabmin_doc@mil.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034022

09.10.2019 № 220/5080

Г

Г

Народному депутату України
Ігорю ГУЗЮ

На № 01/09/19 від 10.09.2019

Шановний пане Ігорю!

У Міністерстві оборони України розглянуто Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 13 вересня 2019 року, щодо завершення робіт з будівництва 44-квартирного житлового будинку з каналізаційною насосною станцією (КНС) у місті Володимирі-Волинському Волинської області для військовослужбовців Збройних Сил України.

За результатами розгляду повідомляю.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Міністерства оборони України від 08.12.2016 № 75/465/2 переможцем торгів з будівництва “м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Глушкова, будівництво 44-квартирного житлового будинку з каналізаційною насосною станцією КНС” (далі – Об’єкт) визначено Товариство з обмеженою відповідальністю “Вінницька будівельна компанія” (далі – ТОВ “ВБК”).

На підставі зазначеного Міністерством оборони України в особі Західного управління капітального будівництва Міністерства оборони України (далі – Західне УКБ), яке виконує функції замовника, з ТОВ “ВБК” укладено договір підряду від 28.12.2016 № 303/35/1 на виконання робіт з будівництва зазначеного Об’єкта. Вартість робіт за договором становить 9 499 457,77 гривні.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі” Міністерством оборони України в червні 2019 року проведено переговорну процедуру закупівлі додаткових робіт по Об’єкту та укладено договір підряду на виконання зазначених робіт з ТОВ “ВБК” від 12.06.2019 № 303/35/25 на суму 4 729 627 гривень.

Згідно з Переліком житлових об’єктів, які передбачається фінансувати у 2019 році за рахунок коштів бюджетної програми КПКВ “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”

003801 *

15.10.2019 12:04

ВХ. № 185736 3.68.2019

(зі змінами), затвердженим наказом Міністерства оборони України від 22 березня 2019 року № 123, передбачено прийняття Об'єкта в експлуатацію у грудні 2019 року.

На цей час за умовами договорів ТОВ "ВБК" виконано роботи, а Міністерством оборони України здійснено оплату на суму 10 775 554,01 гривні.

Відповідно до затвердженої проектної документації виконано основні будівельно-монтажні роботи по Об'єкту та здійснюються роботи з газифікації та електрифікації житлового будинку та КНС.


На сьогодні ТОВ "ВБК" виконуються роботи згідно з календарним графіком, яким передбачено завершення робіт та підготовка Об'єкта до прийняття в експлуатацію до 30 листопада 2019 року.

Довідково. Роботи із внутрішньої електрифікації виконано в повному обсязі, із зовнішньої електрифікації – на 92 відсотка (залишились роботи з монтажу та підключення КТПГН з трансформатором, які доставлено на будівельний майданчик). Роботи з газифікації житлового будинку виконано на 45 відсотків, (залишились роботи з монтажу зовнішнього газопроводу, частково внутрішнього газопроводу, встановлення та підключення газових котлів і плит, які знаходяться на будівельному майданчику).

Питання забезпечення житлом військовослужбовців Володимир-Волинського гарнізону перебуває на постійному контролі в Міністерстві оборони України.

З повагою

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

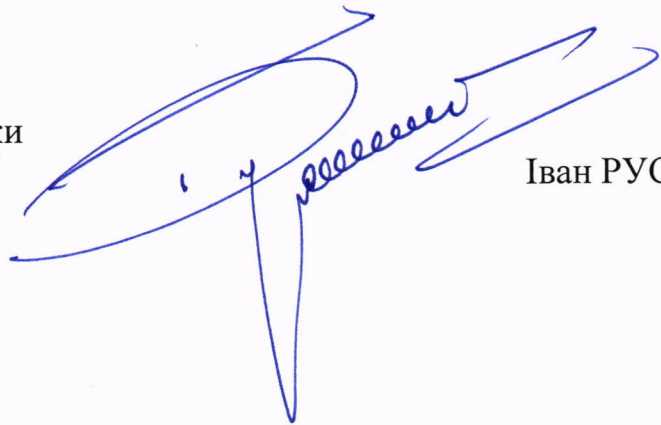

Іван РУСНАК
